


# Pegel Heimborn

## Ereignis 57, HQ 9

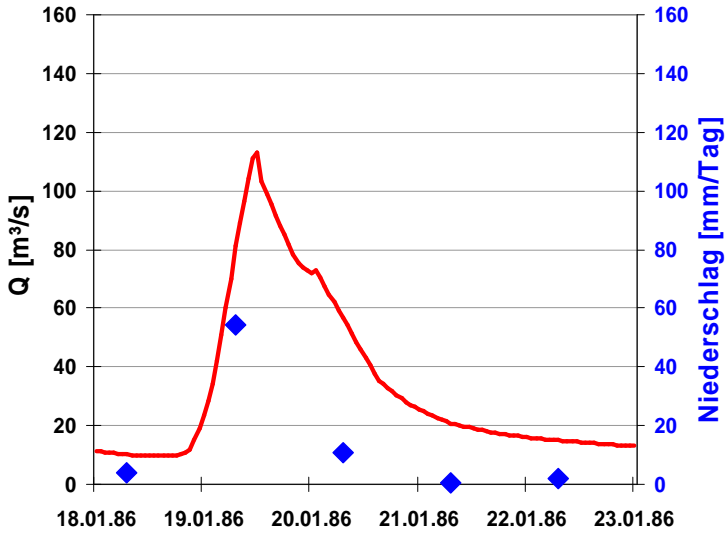

N-Summe: 54,09 mm  
Scheitelabfluss: 113,0 m³/s

Q Ereignisbeginn: 9,65 m³/s  
Ereignisdauer: 100 Std.  
Abflussbeiwert: 66 %

N-Dauer: 2 Tage  
max. N-intensität: 54,09 mm/Tg

Vorfeuchte: sehr hoch  
Wetterlage: 1

### Niederschlagsverteilung

